

Die Renovierung der Evangelischen Kirche Heltau/ Siebenbürgen

- Stand Oktober 2021 -



Oktober 2021



Oktober 2021









Außenrenovierung

- Die Außenrenovierung ist noch nicht abgeschlossen
- Da durch den Putz keine einheitliche Färbung erreicht werden konnte, sollen alle Flächen/ Fassaden
 1. einen Kalkputz erhalten
 2. einen Feinputz
 3. gestrichen werden

Alle Dächer wurden neu gedeckt,
Hauptdach und Seitentürme mit zu 80 % wiederverwendeten Ziegeln
Hauptturm und Seitenschiffe mit neuen Ziegeln

Hauptturm/ Westturm



April 2021



Oktober 2021

West-Fassade des Hauptturmes



April 2021



Oktober 2021

Hauptturm/ Westturm

Verputzte Ostfassade des Hauptturmes
- keine einheitliche Farbe
- muss deshalb neu angestrichen werden

Freigelegte romanische Fenster
des Hauptturmes




April 2021



Oktober 2021

April 2021

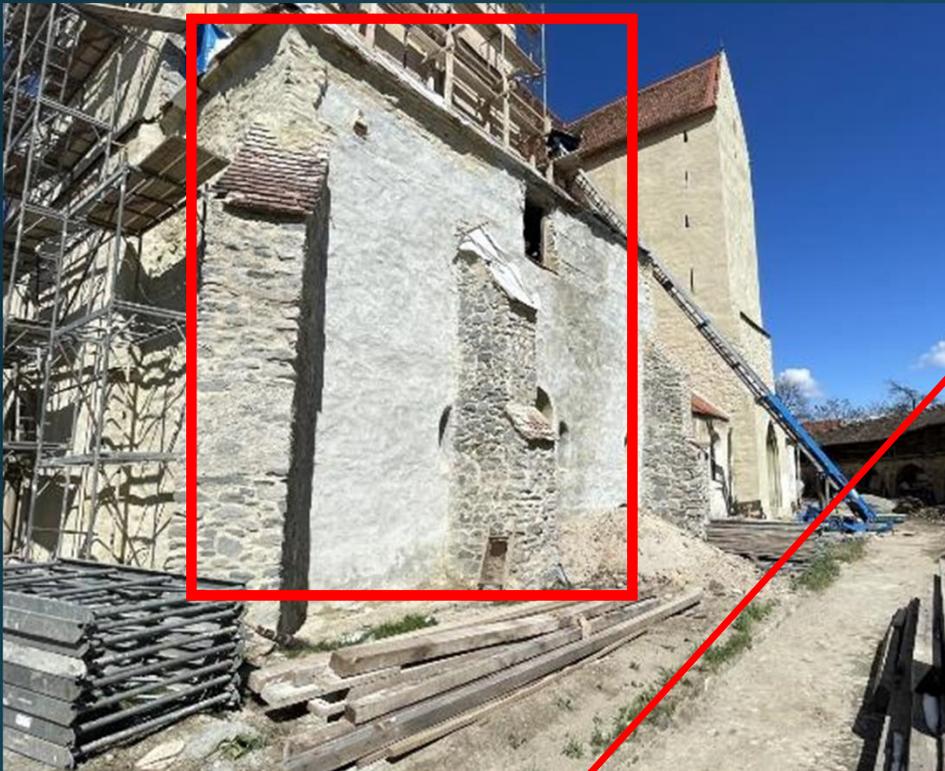

Kleiner Seitenturm
- soll neuen Dachstuhl erhalten
- muss neu verputzt werden

freigelegte romanische Fenster



Oktober 2021

Dächer

- Alle Dächer wurden neu gedeckt,
- Hauptdach und Seitentürme mit zu 80 % wiederverwendeten Ziegeln
- Hauptturm und Seitenschiffe mit neuen Ziegeln
- Der Dachstuhl des kleinen südlichen Seitenturms wurde neu errichtet werden und mit neuen Ziegeln gedeckt



April 2021







Oktober 2021




Gedecktes Hauptschiff und Seitenschiff

April 2021



Oktober 2021

April 2021

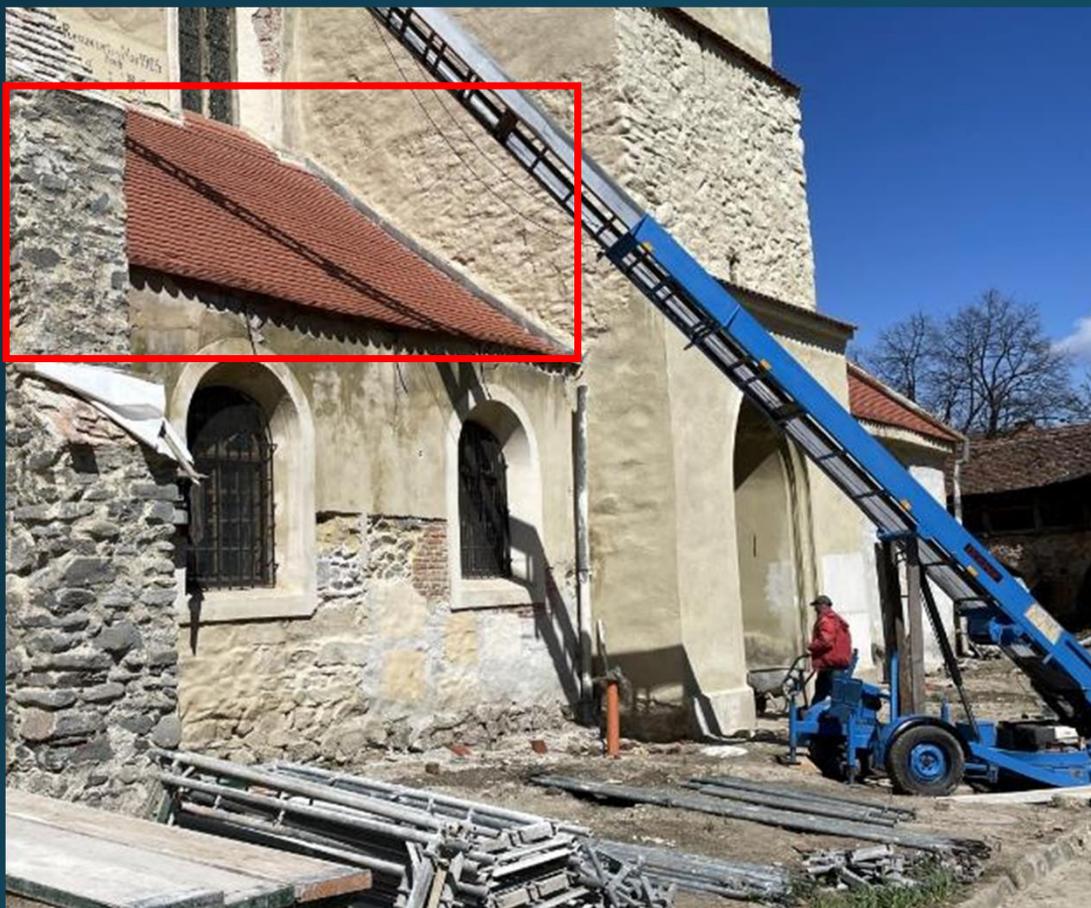

Neugedecktes Seitenschiff



Neugedeckte Schatzkammer
Verputz muss ausgebessert werden+Feinputz



Oktober 2021



Neugedeckte Sakristei

April 2021



Oktober 2021



Neugedecktes, nördliches Seitenschiff

April 2021




Oktober 2021

Südturm



- wurde grob verputzt
- soll einen Feinputz erhalten und danach gestrichen werden

April 2021

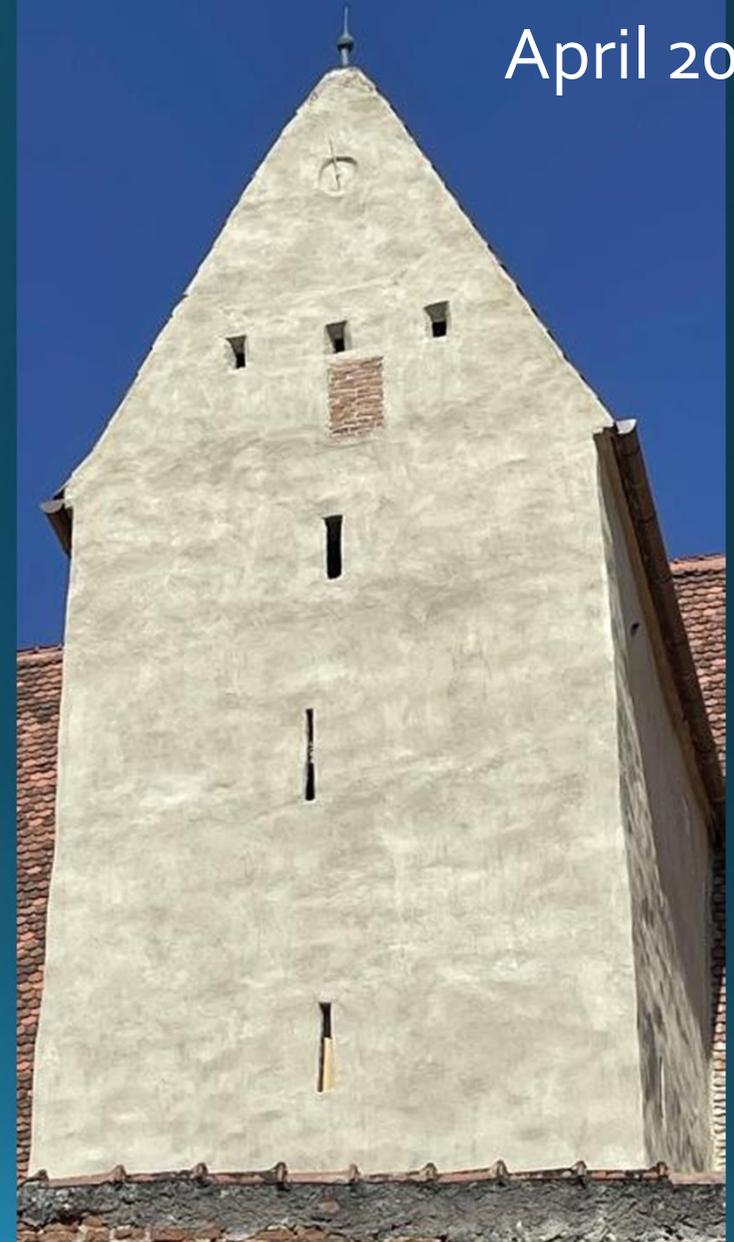



Oktober 2021

Ostturm und Apsis




Feinputz wurde aufgetragen, muss noch gestrichen werden

April 2021




Oktober 2021

Nordturm

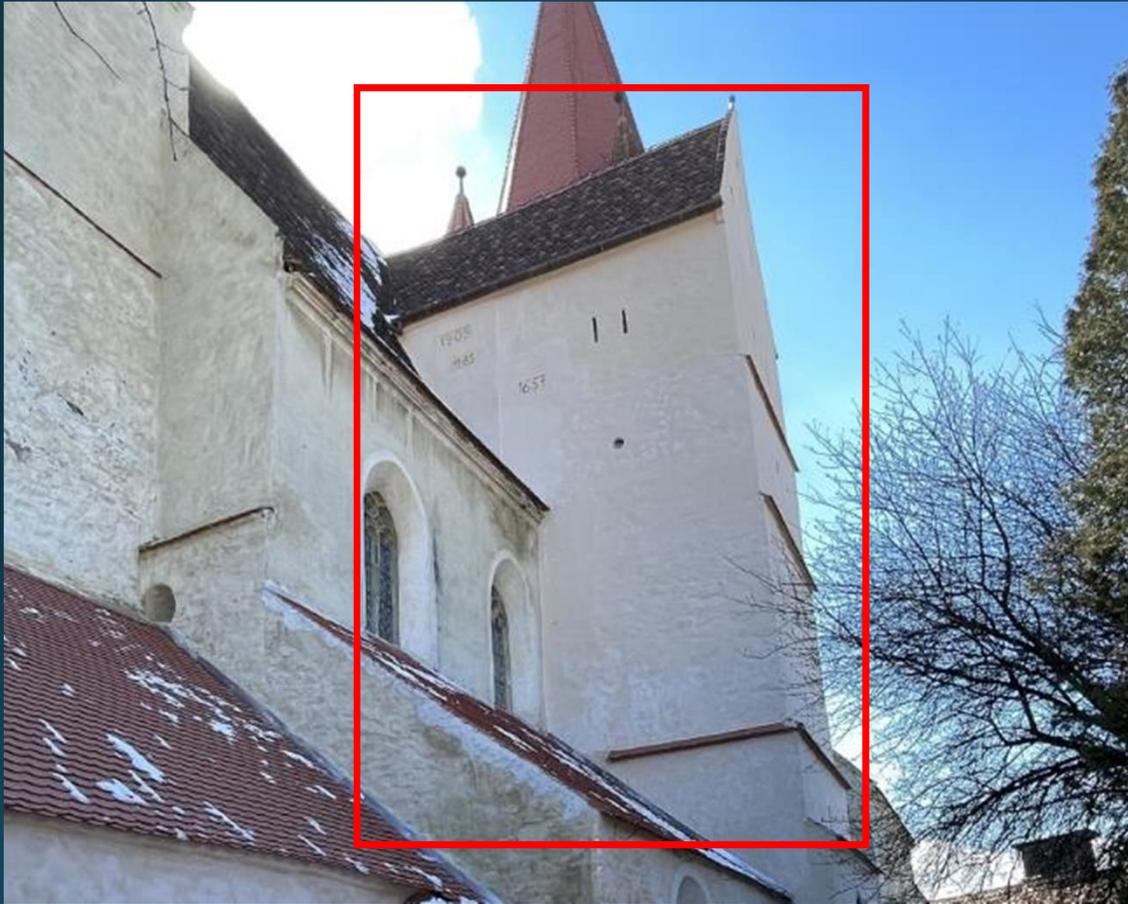

Ist bereits verputzt, Farbe ist nicht einheitlich, darum wird noch einmal gestrichen



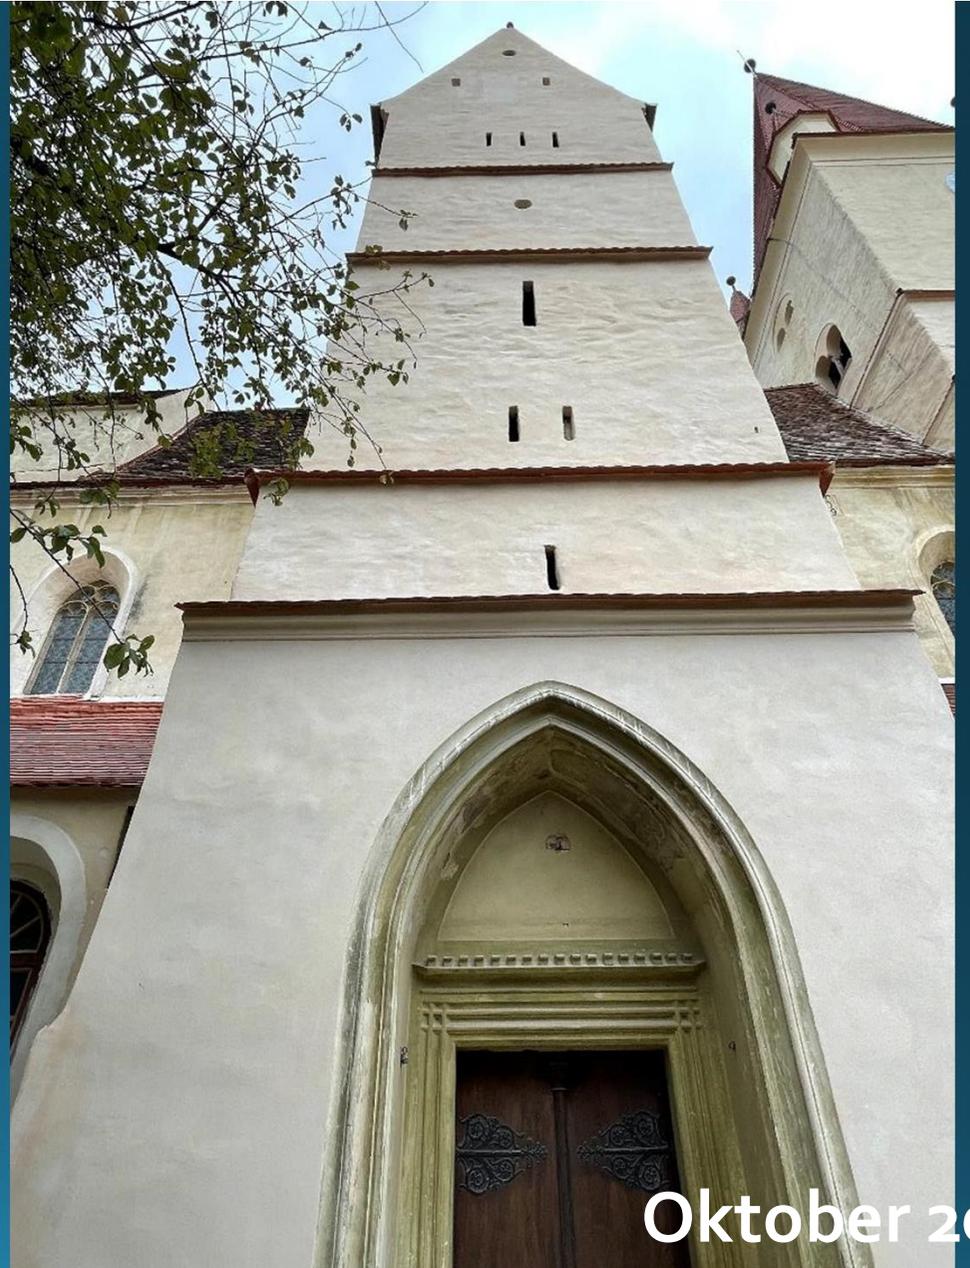

Oktober 2021

Nördliches Seitenschiff

April 2021



- Ist bereits verputzt, Farbe ist nicht einheitlich, darum wird noch einmal gestrichen



Oktober 2021

April 2021


Innenrenovierung

- Im Inneren der Kirche sind die archäologischen Arbeiten abgeschlossen – es wird ein ausführlicher Bericht vom Archäologen-Team erwartet
- An vielen Stellen ist ein starker Schwamm-Befall festgestellt worden (echter Hausschwamm, *serpula lacrymans*)
- Das erfordert eine gründliche Behandlung
- Die Mauern und das Erdreich wurden mit Feuer abgebrannt. Nun folgt eine Behandlung mit Chemikalien
- Nach der chemischen Behandlung folgt das Aufschütten einer 20 cm Kiesschicht und eines Betonestrich
- Danach kann das Gerüst im Inneren der Kirche errichtet werden
 1. für die Fortsetzung der Konservierungsarbeiten an den Fresken (ab 1.06)
 2. für die Beseitigung des Zementputzes (ab 1.06)





Oktober 2021

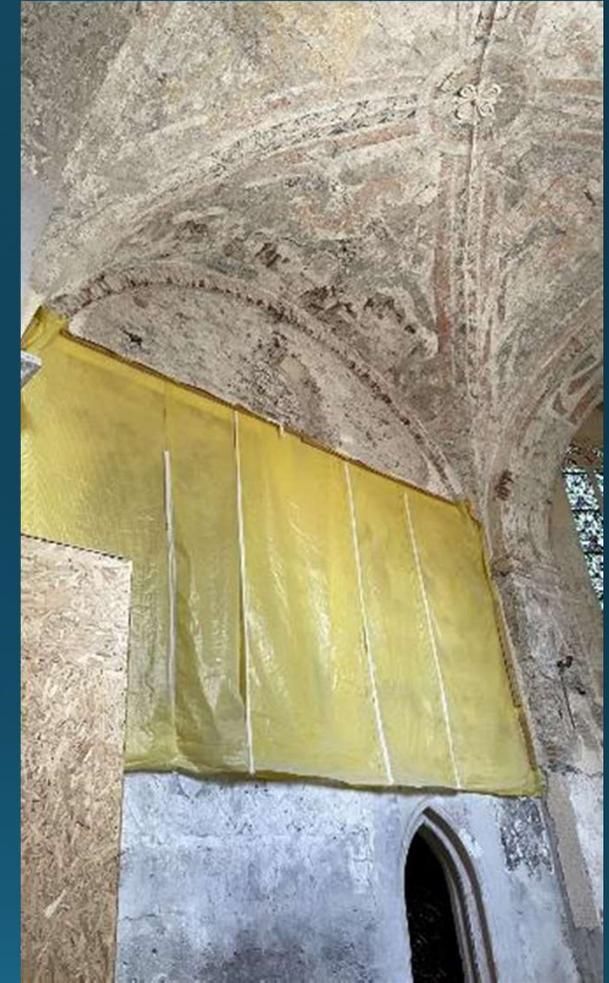

Auch im Altarbereich ist ein starker Schwamm-Befall festgestellt worden.
Der „neue“ Heltauer Altar (Braller Altar) ist mit Fachleuten in den Speckturn transloziert worden.

April 2021






Das Kirchenschiff ist für die chemische Behandlung zur Bekämpfung des Hausschwammes vorbereitet.

April 2021



Oktober 2021

Empore

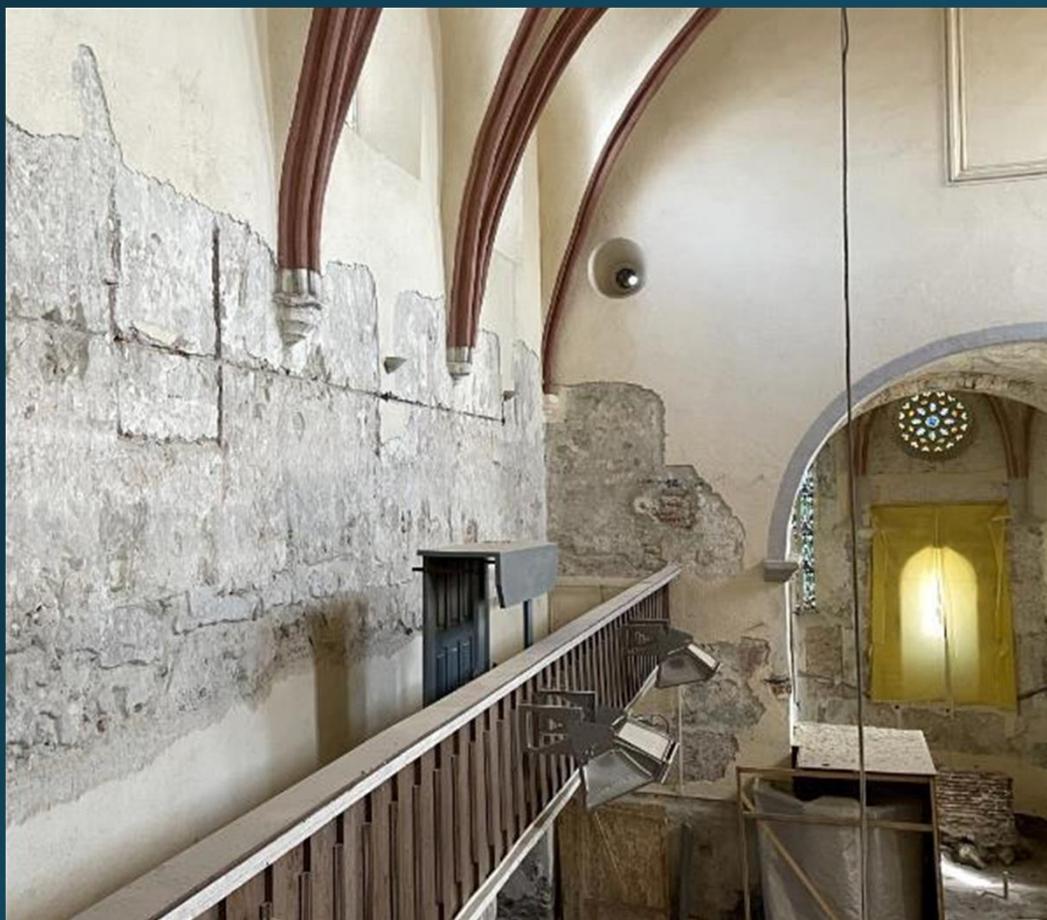



Teilweise freigelegte Fresken – die Arbeiten sollen ab 1.06.2021 fortgesetzt werden

April 2021



Oktober 2021

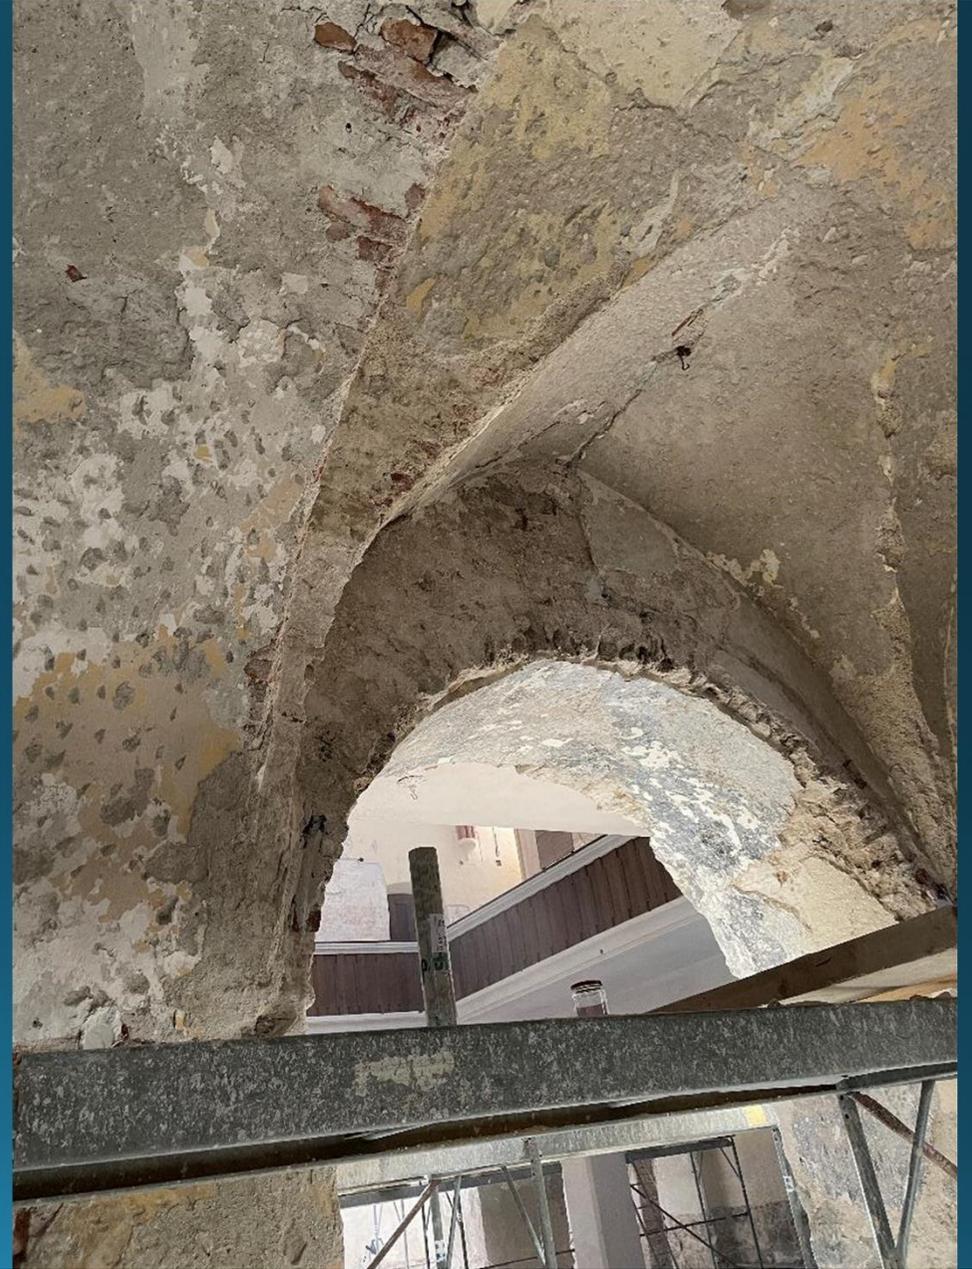

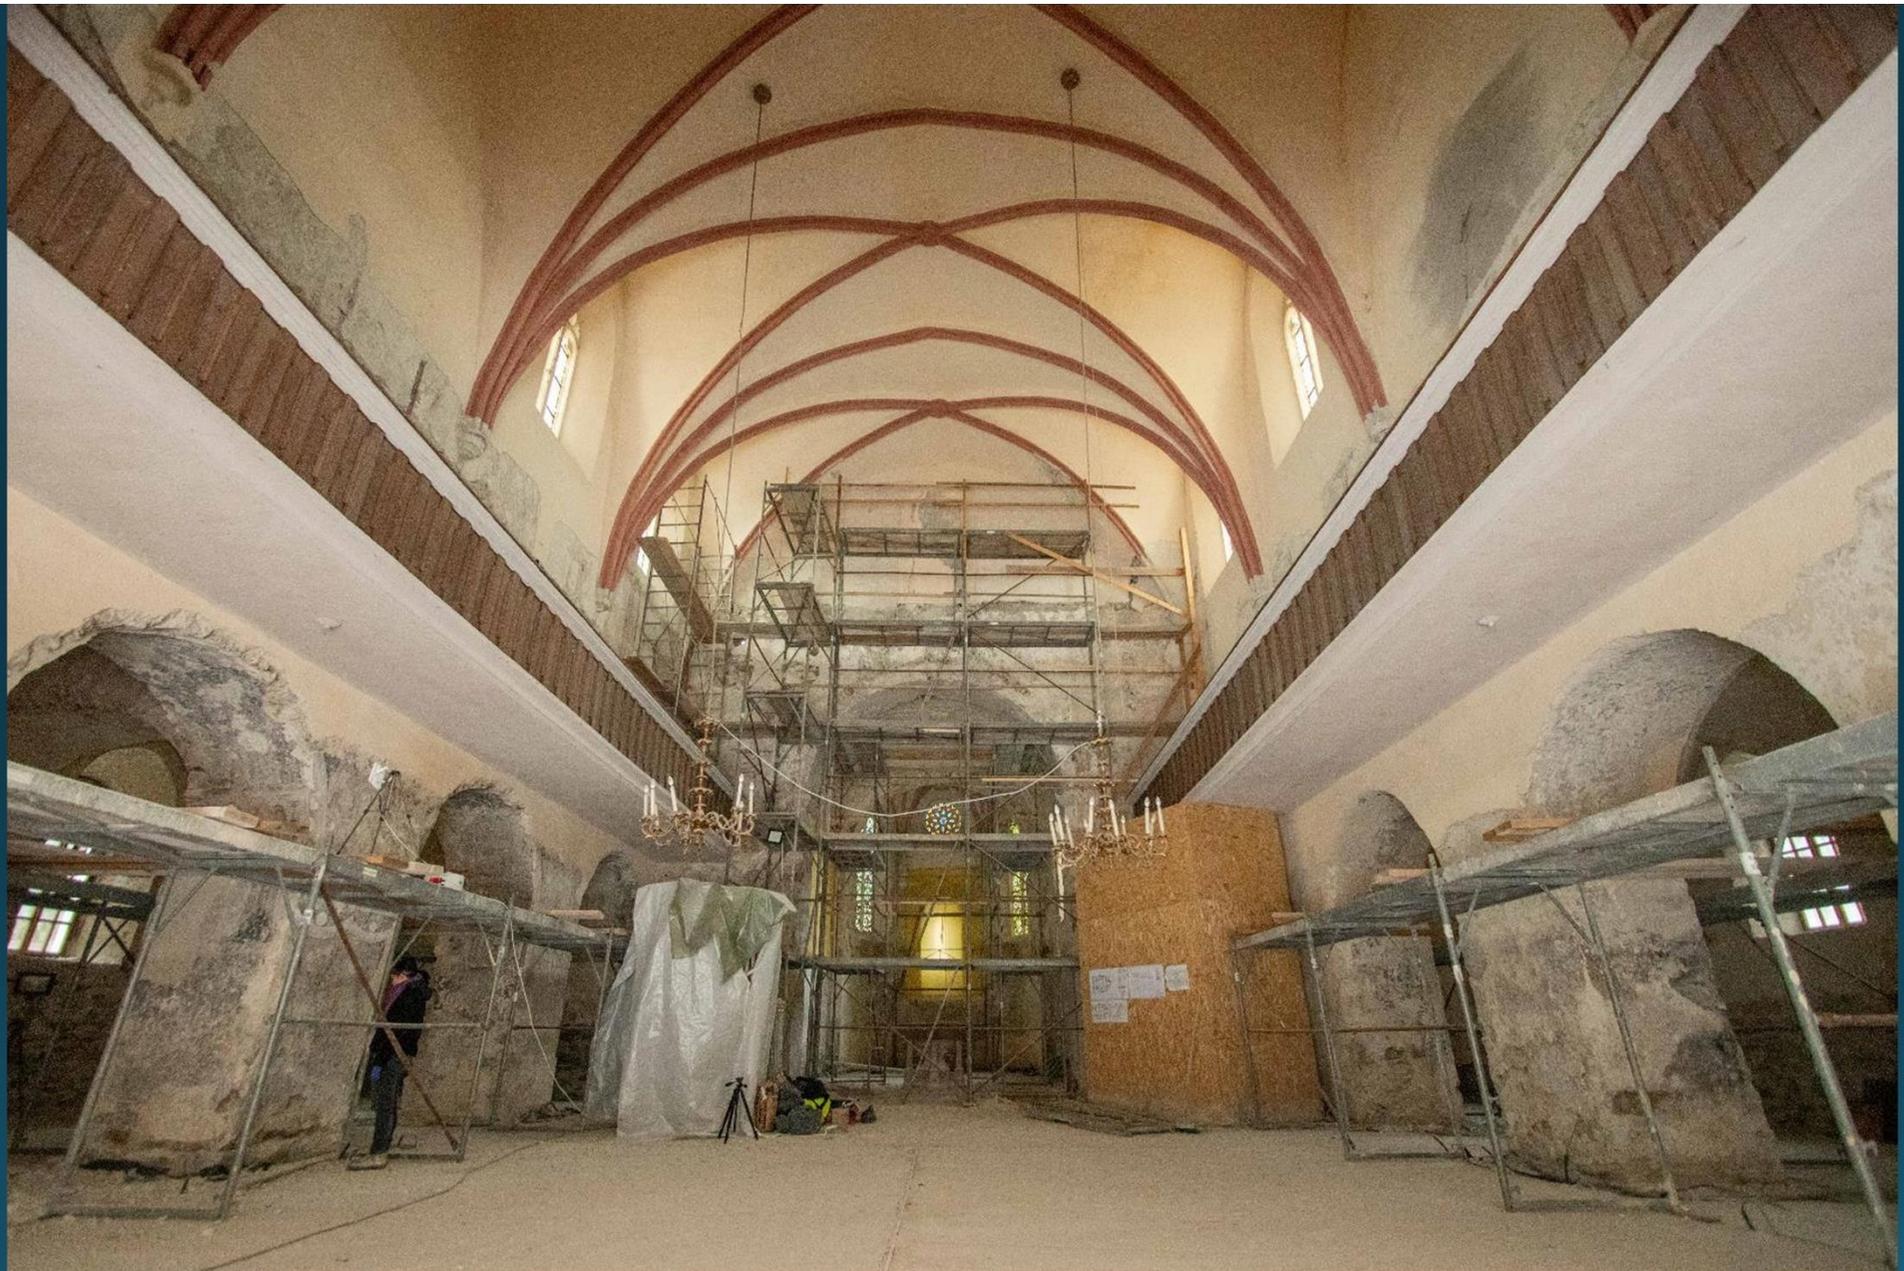











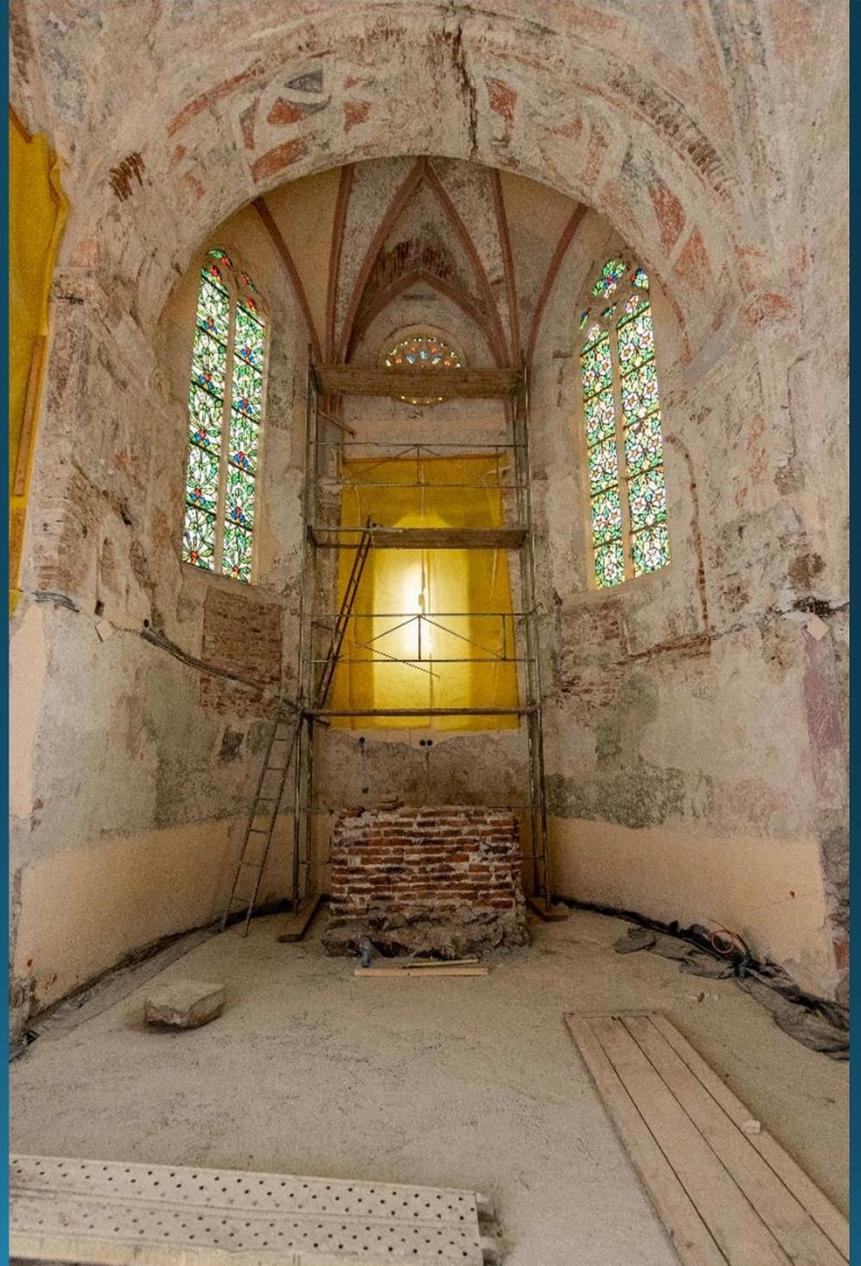



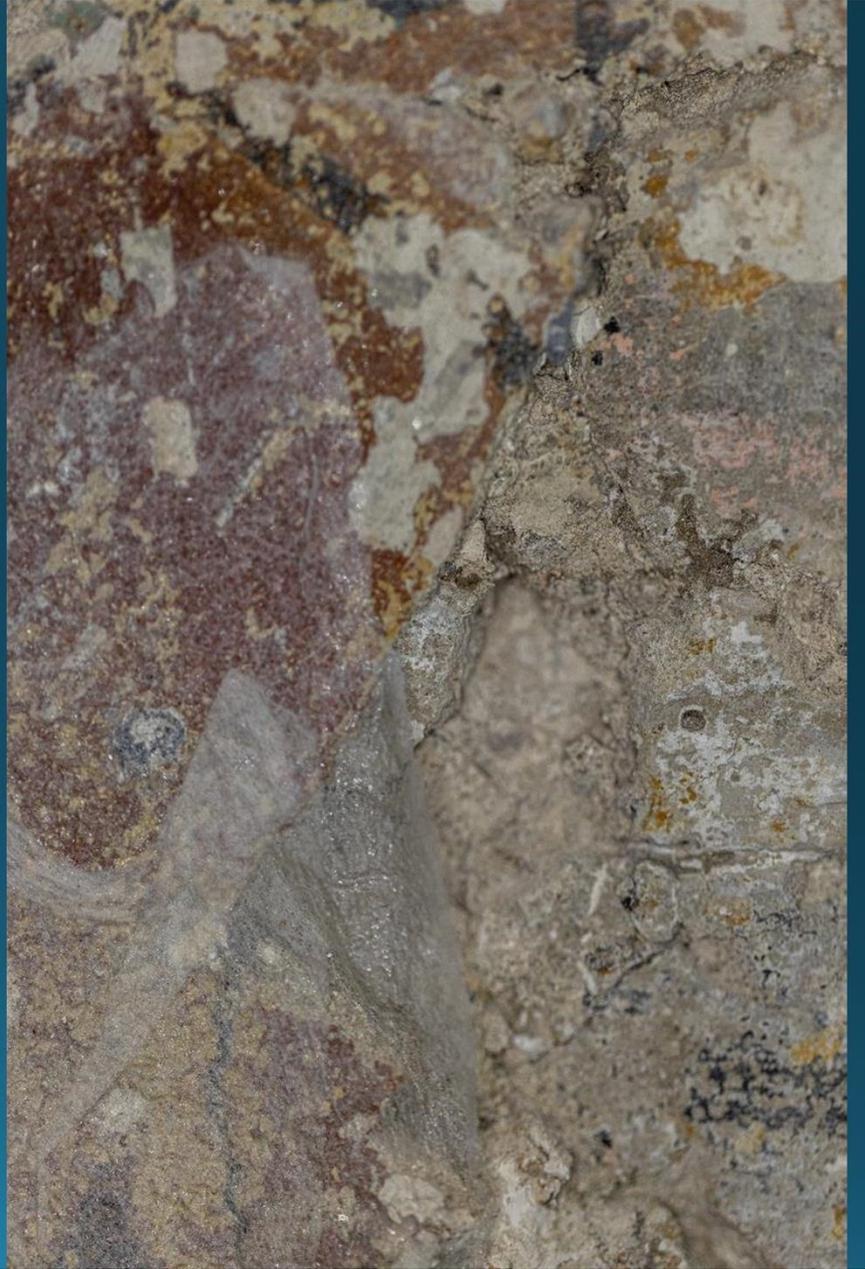





Pfeiler des Hauptturmes



Ebenfalls starker Schwammbefall – Werder-Altar wurde sichergestellt



Oktober 2021




Wehrtürme

- Der alte, graue Zementverputz ist größtenteils entfernt und die Mauer neu verfugt. Hier entstehen Ausstellungsräume.
- Alle Wehrtürme werden begehbar gemacht und sind vom Dachstuhl zugänglich.



Südturm

Südturm

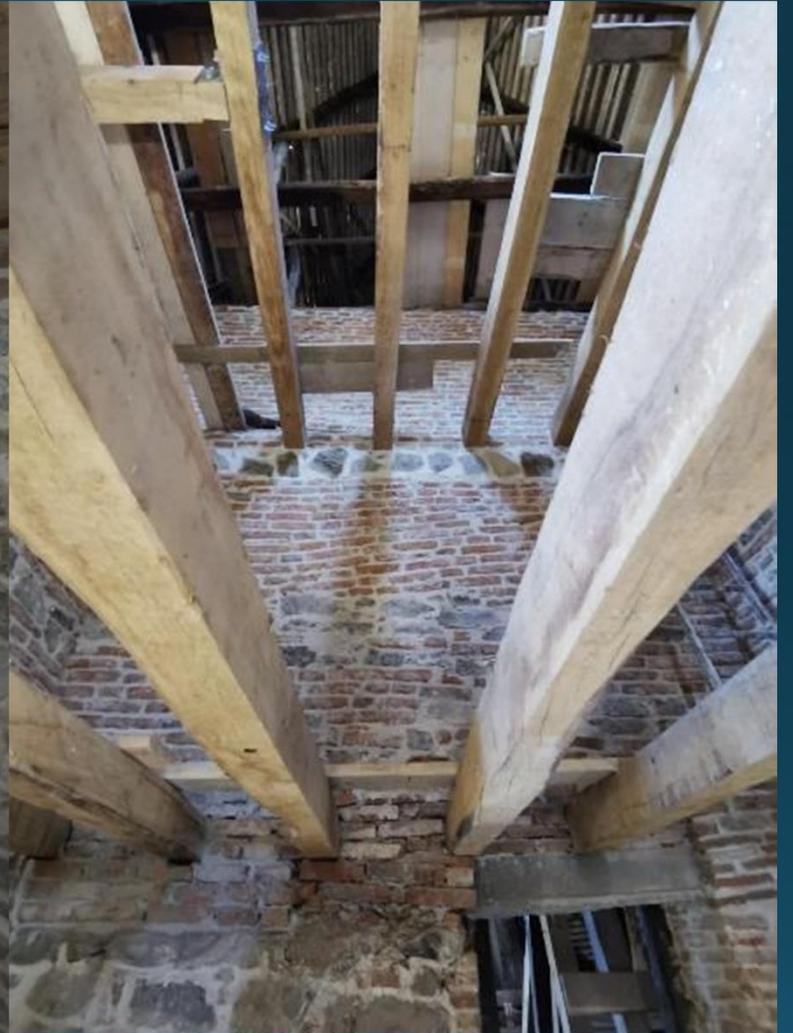

Ostturm



Nordturm



verfugtes Gewölbe



verfugte Mauer

Nordturm



verfugte Mauer

Hauptturm/ Westturm



verfugte Wand

Hauptturm - Brandschutzgewölbe



Das Gewölbe und die Mauern wurden verputzt



Alter Putz – „Zeuge“



Aufgang zu den Glocken

Dachstuhl



Dachstuhl



Mit Stahlbarren gespannte Deckenbalken um das Gewicht des Dachstuhl vom Gewölbe auf die Aussenmauern zu verlagern

Dachstuhl



Neue Streben

Dachstuhl



Vielen herzlichen Dank für die
Unterstützung der Kirchenrenovierung
durch Eure/ Ihre Spenden!
